

【報告事項2】大阪ヘルスケアパビリオンの建築工事進捗状況について

■ 膜屋根工事・外装工事まで完了

①外観正面（8月26日撮影）



②外観東寄り（8月14日撮影）




空撮（7月23日撮影）



【報告事項2】大阪ヘルスケアパビリオンの建築工事進捗状況について

■内装工事・外構工事を実施中

■展示・出展ゾーン

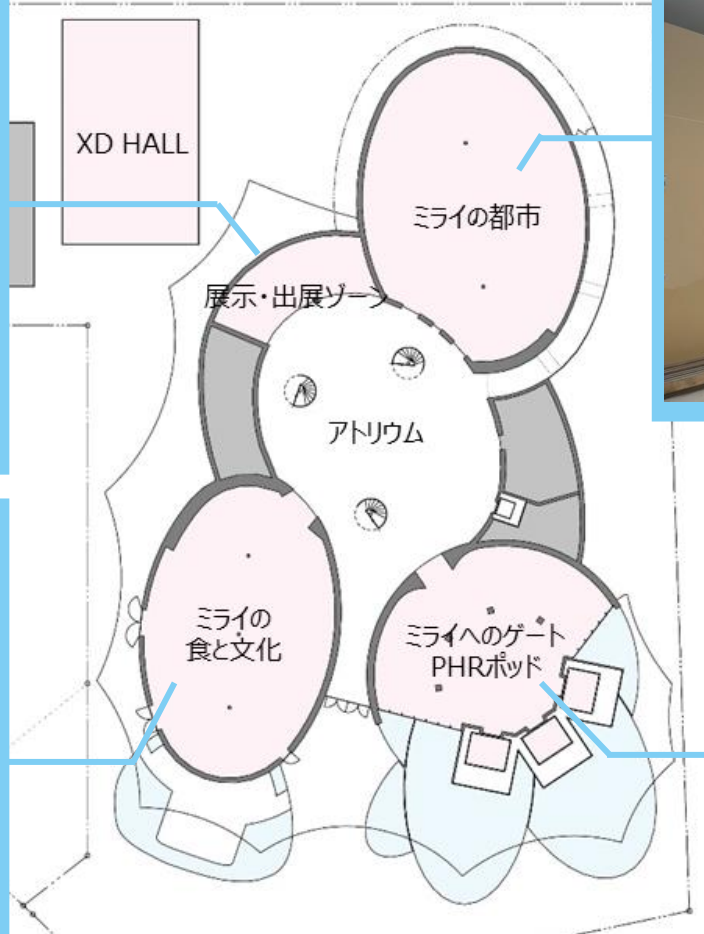

■ミライの都市



■ミライの食と文化




■ミライへのゲート



【報告事項2】大阪ヘルスケアパビリオンの建築工事進捗状況について

■ 内装工事・外構工事を実施中

■ ミライのヘルスケア

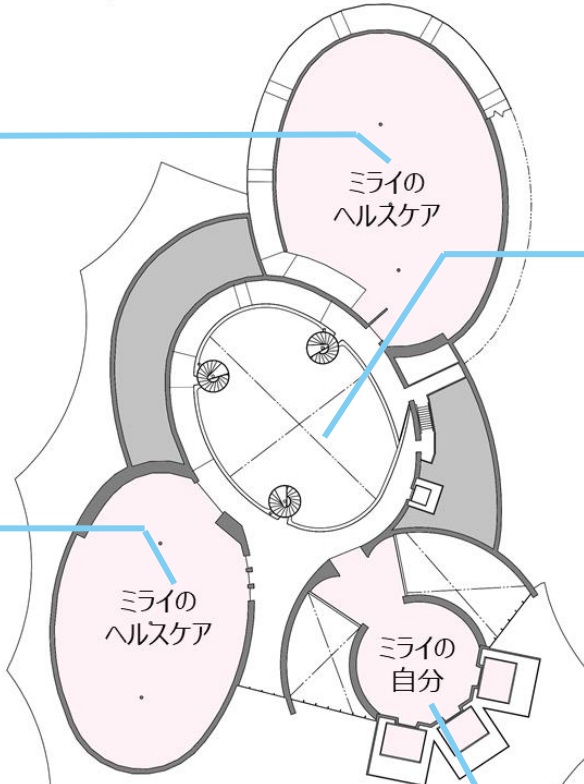

■ アトリウム



■ ミライの自分



■ 工程表

	2024年度												2025		
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月		
建築工事	外装・内装工事									検査	建築工事了				大阪・関西万博
	膜屋根工事					現在									
	外構工事														
展示	展示設計・開発・製作										設置				
									展示工事						
